




Naturschutzgroßvorhaben "Ostrügensche Boddenlandschaft" Biotopersteinrichtende Maßnahmen

Kerngebiet:	IV/4e - Feuchtgebiet nördlich Kluptow	lfd. Nummer: 33
Maßnahme:	Kluptow Stau	

Gemeinde:	Gemarkung	Flur	Flurstück
Stadt Bergen	Zirsevitze	1	62/1
	Kluptow	1	10/15
Eigentümer:	privat		

Kartenausschnitt:

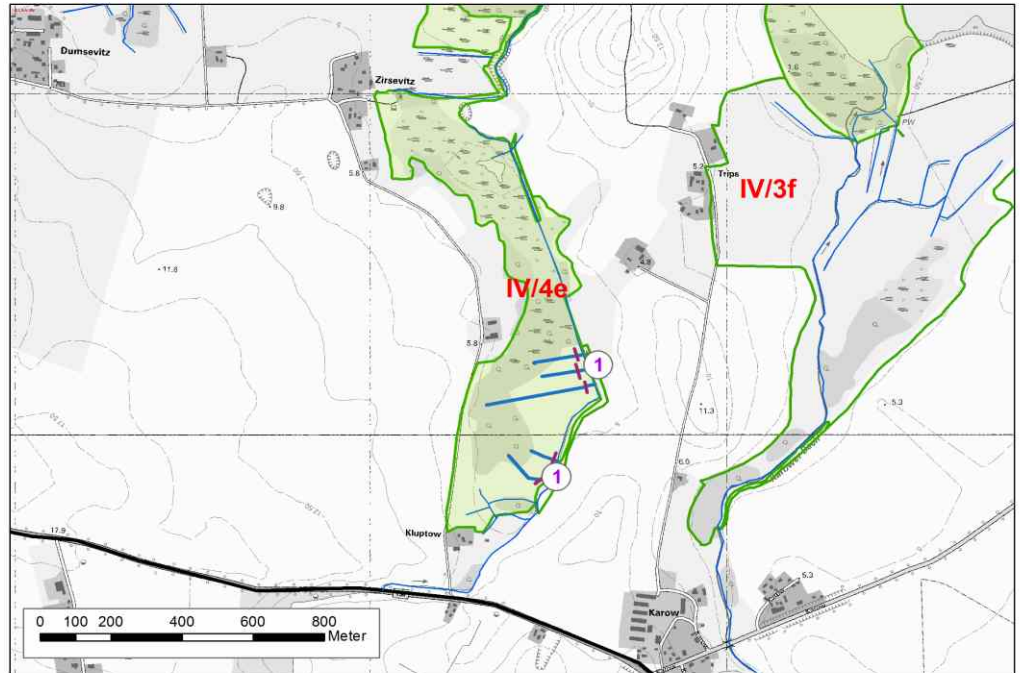

Ausgangssituation: Der Niedermoorkörper wurde durch die angelegten Gräben sehr stark entwässert. Die Folge war eine starke Moordegradation, Quecke dominierte und die Erlenbrüche wurden überwuchert mit Hasel und Holunder.

Zielstellung: Bessere Wasserversorgung der Moorbereiche durch Anhebung des Wasserstandes (ca. 70 cm)

Maßnahmen: 1. Bau von regulierbaren Stauanlagen

Einzelmaßnahmen:	Fläche / Länge:	Zeitraum:	Kosten (€):
1.	5 Stück	2003	25.939,09

Folgemaßnahmen: Die letzte Begehung durch den LPV erfolgte 2008. Die Stau waren weitgehend intakt und funktionsfähig. Allerdings mussten 2 Staubretter ersetzt werden.



Naturschutzgroßvorhaben "Ostrügense Boddenlandschaft" Biotopersteinrichtende Maßnahmen

Kerngebiet: IV/4e - Feuchtgebiet nördlich Kluptow
Maßnahme: Kluptow Staue

lfd. Nummer: 33



neu errichteter Stau 2003



der Stau fügt sich gut in die Umgebung ein (Foto 2008)
